


CRONOPROGRAMMA LAVORI

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	14/12/2015	14/12/2015	0
2	B	Allestimento del cantiere	15/12/2015	17/12/2015	2
3	C.1	Demolizione piano per realizzazione piazza	17/12/2015	21/12/2015	4
4	C.2	scavi	21/12/2015	25/12/2015	4
5	C.3	realizzazione pavimentazione esterna	25/12/2015	18/03/2016	84
6	C.4	impianto di illuminazione	23/02/2016	08/03/2016	14
7	C.5	arredo urbano	19/03/2016	26/03/2016	7
8	C.6	demolizione muro rione marini	15/03/2016	18/03/2016	3
9	C.7	scavi per sistemazione scarpata	18/03/2016	22/03/2016	4
10	C.8	realizzazione muro in c.a.	22/03/2016	11/04/2016	20
11	D.1	opere di rifinitura	11/04/2016	16/04/2016	5
12	D.2	smobilizzo cantiere	16/04/2016	19/04/2016	3
13	D.3				
14	D.4				
15	D.5				
16	D.6				
17	D.7				
18	D.8				
19	E				
20	F				

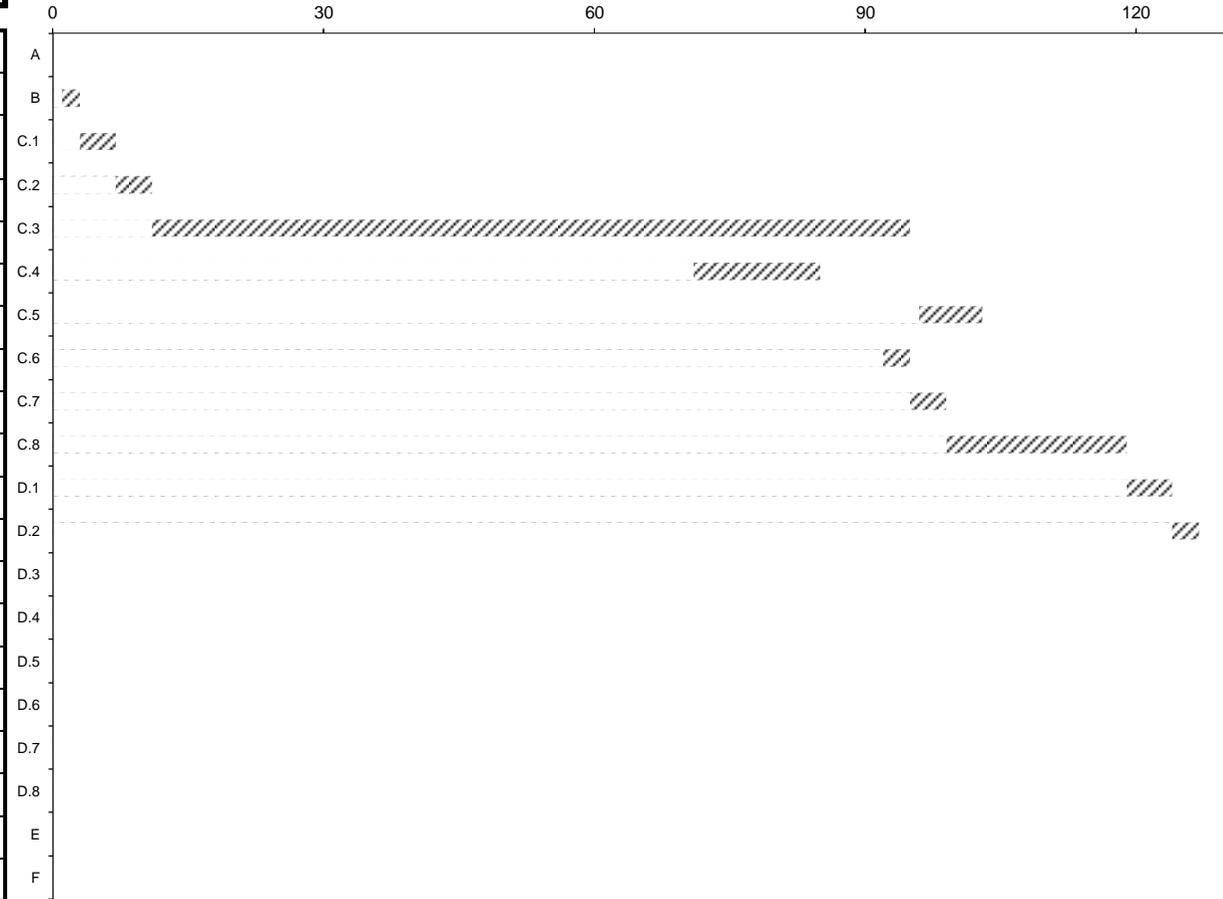

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
150 gg

TC **150** gg.
naturali consecutivi
